ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ
АШАНИН

ТЕХНИЧКИИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИПРОЈЕКТАГЕОДЕТСКОГ ОСМАТРАЊА СЛЕГАЊА ТЛА И ОБЈЕКТА ДЕОНИЦАПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) НАДВОЖЊАК НА КМ 168+690

Трећа епоха

Деловодни број: Н.168+690-3

Ревизија: 00

Датум: Октобар 2024.

Инвеститор:	„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Пројектант:	„Shandong Luqiao group CO. LTD ogranak Beograd” Трг пријатељства Србије и Кине 4, Нови Београд
Консултант:	Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево ул. Војвођански булевар 32/38, Панчево
Објекат:	Пруга Београд – Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
Локација објекта:	Нови Сад - Суботица, Србија
Задатак:	Технички извештај о реализацији пројекта геодетског осматрања слегања објекта
Одговорни извођач:	Драгомир Стојићевић, дипл. геод. инж.
Датум израде:	Октобар 2024.
Ревизија	00

Одговорни извођач:

Драгомир Стојићевић, дипл. геод. инж.

За Геодетске услуге Ашанин

Бојан Ашанин, директор

САДРЖАЈ

Општа документација 4

ТЕХНИЧКИ ДЕО 5

1. Увод 5

2. Теренска мерења и обрада резултата мерења 5

2.1. Реализована мерења у контролној 1Д мрежи 5

2.2. Анализа грешака мерења 7

2.3. Избор методе мерења 8

2.4. Изравање резултата мерења и деформациона анализа у контролној 1Д мрежи 9

3. Садржина елабората геодетских радова 13

4. Закључак 14

5. Нумеричка документација 15

6. Графичка документација 17

Општа документација

5000217676451

ИЗВОД О РЕГИСТРОВАНИМ ПОДАЦИМА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

Република Србија
Агенција за привредне регистре

ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК	
Регистарски/Матични број:	66185222
СТАТУСИ	
Статус предузетника:	Активан
Са статусом социјалног предузетништва:	Не
ЛИЧНИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕТНИКА:	
Име и презиме	Бојан АшанинПол: Мушки
ЈМБГ	2908988860025
ПОДАЦИ О ПОСЛОВНОМ ИМЕНУ	
Пословно име:	Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево
ПОДАЦИ О АДРЕСАМА	
Адреса седишта	
Општина:	ПАНЧЕВО
Место:	ПАНЧЕВО
Број и назив поште:	26000 ПАНЧЕВО
Улица, број и слово, спрат, број стана и слово:	ВОЈВОЂАНСКИ БУЛЕВАР 32, стан 38
Адреса за пријем електронске поште	
Е-пошта:	bojan.ashanin@gmail.com
ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ	
Подаци оснивања	
Почетак обављања делатности:	30.06.2021
Време трајања	
Предузетник је регистрован на:	неодређено време
Претежна делатност	
7112	Инжењерске делатности и техничко саветовање
Остали идентификациони подаци	
Регистарски/Матични број:	66185222
ПИБ:	112555718
Подаци од значаја за правни промет	
Бројеви рачуна у банкама:	325-9500700188095-62 и 325-9601700059770-24

Регистратор: Милашин Маглов

Дана 03.08.2023. године у 13:36:43 часова

Република Србија
Агенција за привредне регистре

5000189000018

Регистар привредних субјеката

БП 67528/2021
Датум, 30.06.2021. године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014 и 31/2019), одлучујући о јединственој регистрационој пријави оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, коју је поднео:

Име и презиме: Бојан Ашанин

доноси

РЕШЕЊЕ

Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, па се у Регистар привредних субјеката региструје:

Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo

са следећим подацима:

Лични подаци предузетника:

Име и презиме: Бојан Ашанин
ЈМБГ: 2908988860025

Пословно име предузетника:

Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo

Пословно седиште: ВОЈВОЂАНСКИ БУЛЕВАР 32, стан 38, ПАНЧЕВО, Србија
Број и назив поште: 26000 ПАНЧЕВО
Регистарски број/Матични број: **66185222**

ПИБ додељен од Пореске Управе РС: **112555718**

Почетак обављања делатности: 30.06.2021 године
Претежна делатност: **7112 -** Инжењерске делатности и техничко саветовање

Предузетник се региструје на: неодређено време

Адреса за пријем електронске поште: bojan.ashanin@gmail.com

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 25.06.2021. године јединствену регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника број БП 67528/2021, за регистрацију:

Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у дипозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС", бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019, 15/2020, 91/2020 и 11/2021).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана од дана објављивања одлуке на интернет страни Агенције за привредне регистре, министру надлежном за послове привреде, а преко Агенције за привредне регистре. Административна такса за жалбу у износу од 480,00 динара и решење по жалби у износу од 550,00 динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР

Миладин Маглов

ОБАВЕШТЕЊЕ:

У прилогу овог решења налази се потврда о додели пореског идентификационог броја (ПИБ) и потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање.

Ако се у прилогу решења не налазе наведене потврде у обавези сте да урадите следеће:

1. Да се обратите Пореској управи ради доделе ПИБ-а,
2. Да лично поднесете јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање, **ОДМАХ** по пријему овог обавештења И САМО УКОЛИКО СТЕ ПРИЈАВИЛИ ПОЧЕТАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ, на једном од шалтера било које организационе јединице организације за обавезно социјално осигурање (Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички завод за здравствено осигурање, Национална служба за запошљавање) или преко портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања (http://www.croso.rs/), уколико већ нисте пријављени на осигурање по основу радног односа код другог послодавца. и то само уколико сте пријавили почетак обављања делатности.

Напомена: Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима

Република Србија
Агенција за привредне регистре

5000189241794

Регистар привредних субјеката
БП 71179/2021

Дана, 06.07.2021. године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019), одлучујући о регистрационој пријави промене података код Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo, са матичним/регистарским бројем: 66185222, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Бојан Ашанин

доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката, региструје промена података код:

Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo

Регистарски/матични број: **66185222**

и то следећа промена:

- **Промена података о пословном имену:**

  Брише се:

  Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo

  Уписује се:

  Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 02.07.2021. године регистрациону пријаву промене података број БП 71179/2021 и уз пријаву је доставио документацију наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019, 15/2020, 91/2020 и 11/2021).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана од дана објављивања одлуке на интернет страни Агенције за привредне регистре, министру надлежном за послове привреде, а преко Агенције за привредне регистре. Административна такса за жалбу у износу од 480,00 динара и решење по жалби у износу од 550,00 динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР

Миладин Маглов

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

број 952-03-259/2021

Дана: 10.09.2021. године

Београд

Републички геодетски завод, решавајући по захтеву Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево, Војвођански Булевар 32 стан 38, ПАНЧЕВО, за издавање лиценце за рад, на основу члана 13. став 2. Закона о државном премеру и катастру («Службени гласник РС», број 72/09, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15, 47/17, 113/17, 27/18, 41/18 и 9/20) и члана 136. Закона о општем управном поступку («Службени гласник РС», број 18/2016 и 95/18), доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

ИЗДАЈЕ СЕ лиценца за рад геодетској организацији Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево, (МБ 66185222) и то за:

- израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта

- извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова

- израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат

- израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања

- реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања

Крстић Милица, дипломираном инжењеру геодезије, и имаоцу геодетске лиценце првог реда, Ашанин Бојан, мастер инжењеру геодезије, запосленима у геодетској организацији Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчевоиздају се легитимације за идентификацију.

Одштампани примерак оригиналног електронског документа

О б р а з л о ж е њ е

Геодетска организација Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево, поднела је Републичком геодетском заводу захтев за издавање лиценце за рад.

Уз захтев је достављена следећа документација:

- решење о упису геодетске организације у регистар агенције за привредне регистре

- попуњен образац запослени (прилог 2)

- доказ о стручној спреми за лица геодетске струке без геодетске лиценце и лица пољопривредне струке

- потврду о поднетој пријава на обавезно социјално осигурање за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке

- штампани податак из читача електронске личне карте, односно фотокопију личне карте за коју није могуће одштампати податке користећи читач личних карата, за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке

- две фотографије димензија 30 x 35 mm за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке, за потребе издавања легитимације за идентификацију

- попуњен образац геодетски инструменти (прилог 3)

- доказ о поседовању геодетских инструмената (минимум један) којима геодетска организација обезбеђује хоризонтално и вертикално позиционирање тачака у државном референтном систему

- документ о исправности геодетских инструмената из тачке 12) овог става, који не сме бити старији од две године

- за Крстић Милица, достављена је диплома Грађевинског факултета Универзитета у Београду, копија геодетске лиценце првог реда, потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање и очитана лична карта.

- за Ашанин Бојан, достављена је диплома Грађевинског факултета Универзитета у Београду, потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање и очитана лична карта.

Ценећи достављене исправе, Републички геодетски завод је утврдио да геодетска организација испуњава услове из члана 17. став 1., 3., 4. и 5. Закона о државном премеру и катастру («Службени гласник РС», бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15, 47/17, 113/17, 27/18, 41/18 и 9/20), па је одлучено као у ставу 1. диспозитива овог решења.

Обзиром да је одредбама члана 16. став 1. наведеног закона прописано да лицу геодетске струке запосленом у геодетској организацији, Завод издаје легитимацију за идентификацију, одлучено је као у ставу 2. диспозитива овог решења.

Наплаћена је административна такса у износу од 330,00 динара, сходно тарифном бр. 1. Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19 , 98/20, 144/2020 и 62/2021), такса за издавање лиценце за рад у износу од 9.050,00 динара и такса за издавање легитимација за запослене у износу од 2.940,00 динара, сходно тарифном броју 215љ Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19 , 98/20, 144/2020 и 62/2021).

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 8 дана од дана пријема решења, а преко Републичког геодетског завода у Београду, Булевар војводе Мишића бр. 39, са доказом о плаћеној републичкој административној такси у износу од 490,00 динара сходно тарифном бр. 6 горе поменутог Закона, на жиро-рачун пореске управе Београд број 840-742221843-57 са позивом на број 7801640600.

ИВАНА ЖИВАНОВИЋ 011227901 Sign

Digitally signed by ИВАНА ЖИВАНОВИЋ 011227901 Sign
DN: c=RS, serialNumber=PNORS-2207987715295, serialNumber=CA:RS-011227901, sn=ЖИВАНОВИЋ, givenName=ИВАНА, cn=ИВАНА ЖИВАНОВИЋ 011227901 Sign
Date: 2021.09.10 13:18:26 +02'00'

Припремила: Ивана Живановић, дипл.правник

Парафирала: Александра Николић, дипл.геод.инж.

В.Д. ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА

Aleksandra Nikolic
10.09.2021 14:31:46

Saša Đurović
13.9.2021 8:04:42

Саша Ђуровић, дипл.геод.инж.

Доставити:

- Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево, Војвођански Булевар 32 стан 38, ПАНЧЕВО (bojan.ashanin@gmail.com)

- СКН Панчево, skn.pancevo@rgz.gov.rs

- Архиви

Одштампани примерак оригиналног електронског документа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА

првог реда

Решењем Републичког геодетског завода

број 952-03-312/2019 од 19. новембра 2019. године

утврђено је да је

Милица Д. Крстић

Дипломирани инжењер геодезије

ЈМБГ 1806955715495

ималац геодетске лиценце првог реда

Број

01 0621 19

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД

ДИРЕКТОР

Мр Борко Драшковић, дипл. геод. инж.

У Београду,

19. Новембар 2019. године

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Драгомир А. Стојићевић

дипломирани инжењер геодезије
ЛИБ 05049066171

одговорни извођач радова

геодетских радова

Број лиценце
471 J292 15

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Проф. др Милисав Дамњановић
дипл. инж. арх.

У Београду,
4. јуна 2015. године

Број: 02-12/2024-12416
Београд, 29.05.2024. године

На основу члана 14. Статута Инжењерске коморе Србије ("СГ РС", бр. 36/19), а на лични захтев члана Коморе, Инжењерска комора Србије издаје

П О Т В Р Д У

Којом се потврђује да је Драгомир А. Стојићевић, дипл. инж. геод.
лиценца број

372 О157 15

Одговорни пројектант геодетских пројеката

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је измирио обавезу плаћања чланарине Комори за текућу годину, односно до 10.04.2025. године, као и да му није изречена мера пред Судом части Инжењерске коморе Србије

М.П.

Председник Управног одбора
Инжењерске коморе Србије

Михајло Мишић, дипл. грађ. инж.

Број: 02-12/2024-12417
Београд, 29.05.2024. године

На основу члана 14. Статута Инжењерске коморе Србије ("СГ РС", бр. 36/19), а на лични захтев члана Коморе, Инжењерска комора Србије издаје

П О Т В Р Д У

Којом се потврђује да је Драгомир А. Стојићевић, дипл. инж. геод.
лиценца број

471 J292 15

Одговорни извођач геодетских радова

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је измирио обавезу плаћања чланарине Комори за текућу годину, односно до 10.04.2025. године, као и да му није изречена мера пред Судом части Инжењерске коморе Србије

М.П.

Председник Управног одбора
Инжењерске коморе Србије

Михајло Мишић, дипл. грађ. инж.

UDRUŽENJE TRANSVERZALA BEOGRAD

Omladinskih brigada 7đ
11070 Novi Beograd
Srbija
e-mail: transverzala.rs@gmail.com
www.transverzala.rs

АТС
02-077
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕТАЛОНИРАЊЕ
ISO/IEC 17025

UVERENJE O ETALONIRANJU

Broj predmeta: 230175/2
Datum: 15.11.2023.

Ukupan broj strana: 1

Vrsta merila:	Nivelir
Vlasnik/korisnik merila:	Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo, Vojvođanski bulevar 32/38, Pančevo
Datum etaloniranja:	15.11.2023.
Proizvođač i tip merila:	LEICA, DNA03
Serijski broj/ Inv. broj:	347072
Metrološke karakteristike:	- merni opseg - uglovi: α = 0° - granica greške: ± 0,3 mm/km (sa invarskim barkod letvama)
Mesto etaloniranja	Omladinskih brigada 7đ, Novi Beograd
Metode etaloniranja:	- SRPS/ISO 17123-2:2014
Sledljivost:	- frekvencijski stabilisani helijum-neonski (He-Ne) laser preko DMDM, (nacionalni etalon dužine)
Rezultati etaloniranja:	- ugao "*i*": 0"
Merna nesigurnost:	- proširena merna nesigurnost merenja visinskih razlika između repera (faktor proširenja k=2): U_{1km}= 0,31 mm/km. *Merna nesigurnost iskazana u ovom Uverenju data je kao proširena merna nesigurnost, gde je standardna merna nesigurnost pomnožena faktorom proširenja k=2, koji za normalnu raspodelu odgovara verovatnoći obuhvata približno 95% (EA-4/02 M).*

METROLOG
Dr Siniša Delčev, dipl. geod. inž.

M.P.

Za, TEHNIČKI RUKOVODILAC LABORATORIJE
Dr Jelena Gučević, dipl. geod. inž.

Uverenje o etaloniranju bez pečata i potpisa nije važeće. Ovo uverenje se ne sme reprodukovati, sem u celini, bez odobrenja laboratorije i korisnika. Rezultati merenja odnose se samo na etalonirane predmete.
Kraj uverenja o etaloniranju.

ТЕХНИЧКИ ДЕО

1. Увод

Пројекат реализације геодетског осматрања слегања објеката пројекта реконструкције, модернизације и изградње пруге Београд – Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), за брзину до 200 km/h, на стационажи km 168+690, израђује се у циљу откривања евентуалних величина слегања које се морају открити, а које су дефинисане условима тачности у пројектном задатку.

Предметни објекат пруге Београд – Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), се налази на стационажи km 168+690.

2. Теренска мерења и обрада резултата мерења

2.1. Реализована мерења у контролној 1Д мрежи

На основу дефинисаног пројекта, а ради вертикалног праћења грађевинског објекта “Надвожњака“ на km 168+690, извршено је геодетско мерење треће епохе. Мерење је реализовано у октобру 2024. године. План мерења, оргиналне резултате мерења као и резултате изравнања мреже приказани су у нумеричком и графичком прилогу.
Тачност мерења (априорни дисперзиони фактор) усвојен је на основу искуствено познате границе тачности инструмената који су на располагању (Leica DNA03) и на основу критеријума задатих пројектним задатком, и износи σ_0= 1 mm. Тачност мерења односи се на тачност елементарне висинске разлике у мрежи, односно на висинску разлику одређену на једној станици.

У циљу добијања захтеваних мера квалитета, мрежа је дефинисана:

- Усвојеним планом мерења и пројектованом геометријом из пројекта геодетског осматрања 1D мреже;
- Усвојеном тачношћу мерења висинских разлика: $\sigma^2{}_h = \sigma^2{}_0 n_i$; где су: n_i- број станица у влаку; а априори дисперзиони стандард σ_0= *1* mm;
- Тежинама мерења висинских разлика: $p_i = \frac{\sigma_0^2}{\sigma_h^2} = \frac{\sigma_0^2}{\sigma_0^2 \cdot n_i} = \frac{1}{n_i}$;
- Број мерених величина је n=31;
- Број непознатих параметара је u=20;
- σ_0= 1 mm.
- Датум је дефинисан минималним трагом на свим тачкама.

Висинске разлике које су изнивелане дате су у табели.

GMO083	G82	-0.3545	183
GMO082	G84	0.1484	201
GMO084	G83	0.2051	124
GMO083	R17	-0.3104	37
R17	R20.1	0.3735	44
R20.1	R18	-0.2733	33
R18	R17	-0.1010	17
R17	R15	0.0627	32
R15	R16.1	-0.0155	14
R16.1	R18	0.0523	45
R16.1	R14	0.0892	31
R14	R13	-0.0034	14
R13	R15	-0.0702	43
R13	R11	0.0335	20
R11	R12	0.0284	18
R12	R14	-0.0591	20
R11	R9	-0.0402	37
R9	R10	-0.0006	13
R10	R12	0.0692	49
R10	R8	-0.1852	37
R8	R7	-0.0190	25
R7	R9	0.2047	35
R7	R5	-0.0424	42
R5	R6	0.0568	21
R6	R8	0.0058	47
R6	R4	0.0923	41
R4	R3	-0.0774	23
R3	R5	-0.0716	35
R3	GMO084	0.1535	114
R10	GMO082	-0.1702	117
R14	GMO083	0.1732	72

Због разлике у броју радних репера који су били дефинисани кроз пројекат осматрања дошло је до промене и броја висинских разлика. Разлика у броју радних репера је дошла услед промене грађевинског пројекта.

2.2. Анализа грешака мерења

Да би резултати извршених мерења задовољили пројектом захтевану тачност дозвољено је да за вероватноћу од 95% буде:

- Дозвољена разлика вредности висинских разлика на једној станици из два положаја инструмента $\Delta \leq 2m_0\sqrt{2}=0.51mm$
- Дозвољено незатварање полигона $\Delta_p \leq 2m_0\sqrt{n}=0.36\sqrt{n}$, где је n-укупан број станица у полигону у једном положају инструмента.

Да би постигли задату тачност посвећена је пажња на следеће изворе грешака.

Извор грешака	**Поступак елиминације**
1. Тачност инструмента	Коришћен инструмент *Leica DNA03* .
2. Грешка поделе летве	Тежило се да буде паран број станица између два репера. Коришћене инварске летве.
3. Нехоризонталност визуре	Пре почетка мерења испитан инструмент. Тежило се да нивелање буде из средине (што је било тешко изводити ради низа фактора који прате текуће грађевинске радове)
4. Стабилност статива	Коришћен стабилни дрвени статив, бирати стабилну подлогу за место станице.
5. Невертикалност летве	Коришћена адекватна либела на летвама. Осетљивост либеле на коришћеној инварској летви је: $\alpha = 12'$
6. Треперење ваздуха	Нивелано у повољним временским условима
7. Ветар	Коришћене значке за стабилизацију летви

2.3. Избор методе мерења

Мерења у 1Д контролној мрежи, реализована су методом геометријског нивелмана. Приликом мерења је коришћен инструмент декларисане тачности од 0.3 mm/km. Због неопходне ефикасности коришћен је дигитални нивелир са инварским бар-код летвама одговарајуће тачности. Пре почетка мерења испитана је исправност инструмента.

Реализација мерења почела је након констатације извођача радова да су испуњени сви услови.

Приликом мерења придржавали смо се следећих услова тачности:

- Приликом мерења **тежили** смо да се инструмент налази на једнакој удаљености од обе летве;
- Мерења су реализовани само у периоду мирних и јасних ликова;
- Мерења изведена по затвореним полигонима датим у графичком Прилогу са скицама мрежа;
- Контролисана мерења према критеријумима за праћење и контролу мерења;
- Дужина визуре није била већа од 50m;
- Тежили смо да летву не читамо ниже од 0.3m у односу на терен;

Инструмент и прибор за мерење:

ОПРЕМА	КОМАДА
НИВЕЛИР (ПРЕЦИЗНОСТ 0.3mm/km)	1
ПРЕЦИЗНЕ НИВЕЛМАНСКЕ ЛЕТВЕ	2
ДРЖАЧИ ЗА ЛЕТВЕ	2
ПАПУЧЕ	2

Једну геодетску теренску екипу су чинили:

- Један геодетски стручњак;
- и два фигуранта.

2.4. Изравање резултата мерења и деформациона анализа у контролној 1Д мрежи

Висине тачака мреже добили смо изравнањем мерења. Изравнање је урађено по методи најмањих квадрата са датумом дефинисаним минималним трагом свих репера. Тежине мерених величина су дефинисане бројем станица у поједином нивелманском влаку: $p_i = \frac{1}{n_i}$

Показатељи тачности оцена 1Д *изравнања су:*

- Стандардна одступања оцена координата σ_H

G82	110.555	110.5555	0.3	0.8	0.5	0
G83	110.911	110.9095	0.2	0.6	-1.5	0.1
G84	110.705	110.7041	0.3	0.8	-0.9	0
R17	110.5991	110.5991	0.2	0.6	0	0.1
R20.1	110.9721	110.9728	0.2	0.7	0.7	0.2
R18	110.6991	110.6996	0.2	0.6	0.5	0.2
R15	110.6625	110.6625	0.2	0.5	0	0.1
R16.1	110.6463	110.6471	0.2	0.5	0.8	0.1
R14	110.7361	110.7362	0.1	0.4	0.1	0.1
R13	110.7327	110.7328	0.2	0.5	0.1	0.1
R11	110.7668	110.7665	0.2	0.5	-0.3	0
R12	110.7955	110.7951	0.2	0.5	-0.4	0
R9	110.7265	110.7264	0.2	0.5	-0.1	0
R10	110.7259	110.7258	0.2	0.5	-0.1	0
R8	110.5407	110.5407	0.2	0.5	0	-0.1
R7	110.5211	110.5216	0.2	0.5	0.5	-0.1
R5	110.4787	110.479	0.2	0.6	0.3	-0.2
R6	110.5355	110.5356	0.2	0.6	0.1	-0.2
R4	110.6284	110.628	0.2	0.7	-0.4	-0.2
R3	110.5503	110.5506	0.2	0.7	0.3	-0.2

Након провере изравнатих резултата мерења приступило се анализи слегања грађевинског објекта и терена око објекта помоћу програмског пакета *Jag3d.*

3. Садржина елабората геодетских радова

После извршених теренских мерења и обраде резултата мерења *за трећу епоху мерења* израдили смо одговарајући елаборат о геодетском 1Д осматрању објекта и кроз резултате изравнања, који су дати кроз прилоге, доказали да је трећа епоха реализована са задовољавајућом тачношћу.

Трећа епоха изведена је по пројекту док је елаборат о реализацији пројекта геодетског осматрања у трећој епохи мерења израђен је у форми техничког извештаја са одговарајућим прилозима.

Елаборат геодетског осматрања друге епохе 1Д мреже садржи:

1) Општу документацију;
2) Технички извештај;
3) Прилоге.

Општа документација садржи сва неопходна документа о испуњености услова фирме и стручњака за извођење радова на геодетском осматрању објекта.

У прилозима се налази табеларна и графичка презентација резултата опажања друге епохе са пратећим подацима, којима се доказује да су мерења извршена у складу са пројектом.

Ови подаци омогућавају да се стекне увид да ли су геодетски радови изведени са задовољавајућом тачношћу.

У техничком извештају о геодетским осматрањима посебно смо описали и дали податке о 1Д мрежи објекта за праћење слегања:

1) Осврт на извршена мерења (контрола извршених мерења; обрада података; тачност извршених мерења и примењене методе за обраду података);
2) Закључак.

Прилози садрже следеће:

1) Оргинални подаци са терена;
2) изравнање резултата мерења;
3) резултати деформационе анализе
4) нивелманска скица

Елаборат садржати фотокопије уверења о еталонирању инструмената и прибора.

4. Закључак

Извршена мерења у потпуности задовољавају пројектом захтевану тачност и њихови резултати могу послужити као апсолутно поуздана основа за утврђивање коначних кота основних и радних репера за **ТРЕЋУ** епоху октобар 2024. године. Такође на основу урађене нулте, прве, друге и треће епохе можемо да констатујемо померања објекта у вертикалном смислу.

Датум мреже је дефинисан минималним трагом на све тачке.

Постигнута тачност задовољава тражене информације и мерења могу да се усвоје за утврђивање слегања тла и објекта.

5. Нумеричка документација

Прилог 1 – Изравнање резултата мерења у контролној 1Д мрежи

MicroSurvey STAR*NET-ULTIMATE Version 9,1,4,7868
Run Date: Fri Oct 25 2024 20:20:03

Summary of Files Used and Option Settings

Project Folder and Data Files

Project Name 1
Project Folder C:\USERS\NEMNJ\DESKTOP
Data File List 1. 1.dat
2. 168+690\168 Dna.dat

Project Option Settings

STAR*NET Run Mode : Adjust with Error Propagation
Type of Adjustment : Lev
Project Units : Meters
Input/Output Coordinate Order : North-East
Create Coordinate File : Yes

Instrument Standard Error Settings

Project Default Instrument
Differential Levels : 0.002403 Meters / Km

Number of Differential Level Observations (Meters) = 31

From	To	Elev Diff	StdErr	Length
G83	G82	-0.3545	0.0010	183
G82	G84	0.1484	0.0011	201
G84	G83	0.2051	0.0008	124
G83	R17	-0.3104	0.0005	37
R17	R20.1	0.3735	0.0005	44
R20.1	R18	-0.2733	0.0004	33
R18	R17	-0.1010	0.0003	17
R17	R15	0.0627	0.0004	32
R15	R16.1	-0.0155	0.0003	14
R16.1	R18	0.0523	0.0005	45
R16.1	R14	0.0892	0.0004	31
R14	R13	-0.0034	0.0003	14
R13	R15	-0.0702	0.0005	43
R13	R11	0.0335	0.0003	20
R11	R12	0.0284	0.0003	18
R12	R14	-0.0591	0.0003	20
R11	R9	-0.0402	0.0005	37
R9	R10	-0.0006	0.0003	13
R10	R12	0.0692	0.0005	49
R10	R8	-0.1852	0.0005	37
R8	R7	-0.0190	0.0004	25
R7	R9	0.2047	0.0004	35
R7	R5	-0.0424	0.0005	42
R5	R6	0.0568	0.0003	21
R6	R8	0.0058	0.0005	47
R6	R4	0.0923	0.0005	41
R4	R3	-0.0774	0.0004	23
R3	R5	-0.0716	0.0004	35

R3	G84	0.1535	0.0008	114
R10	G82	-0.1702	0.0008	117
R14	G83	0.1732	0.0006	72

Adjustment Statistical Summary
==========

Number of Stations = 20

Number of Observations = 31
Number of Unknowns = 19
Number of Redundant Obs = 12

Observation Level	Count of StdRes	Sum Squares Data	Error Factor
Level Data	31	8.055	0.819
Total	31	8.055	0.819

The Chi-Square Test at 5.00% Level Passed
Lower/Upper Bounds (0.606/1.395)

Adjusted Observations and Residuals
==========

Adjusted Differential Level Observations (Meters)

From	To	Elev Diff	Residual	StdErr	StdRes	File:Line
G83	G82	-0.3541	0.0004	0.0010	0.4	2:13
G82	G84	0.1486	0.0002	0.0011	0.2	2:14
G84	G83	0.2054	0.0003	0.0008	0.4	2:15
G83	R17	-0.3103	0.0001	0.0005	0.2	2:16
R17	R20.1	0.3738	0.0003	0.0005	0.5	2:17
R20.1	R18	-0.2731	0.0002	0.0004	0.5	2:18
R18	R17	-0.1007	0.0003	0.0003	1.0	2:19
R17	R15	0.0632	0.0005	0.0004	1.1	2:20
R15	R16.1	-0.0154	0.0001	0.0003	0.5	2:21
R16.1	R18	0.0529	0.0006	0.0005	1.1	2:22
R16.1	R14	0.0891	-0.0001	0.0004	0.2	2:23
R14	R13	-0.0033	0.0001	0.0003	0.2	2:24
R13	R15	-0.0704	-0.0002	0.0005	0.4	2:25
R13	R11	0.0337	0.0002	0.0003	0.6	2:26
R11	R12	0.0286	0.0002	0.0003	0.5	2:27
R12	R14	-0.0589	0.0002	0.0003	0.6	2:28
R11	R9	-0.0402	0.0000	0.0005	0.1	2:29
R9	R10	-0.0006	0.0000	0.0003	0.2	2:30
R10	R12	0.0693	0.0001	0.0005	0.1	2:31
R10	R8	-0.1851	0.0001	0.0005	0.3	2:32
R8	R7	-0.0192	-0.0002	0.0004	0.4	2:33
R7	R9	0.2048	0.0001	0.0004	0.2	2:34
R7	R5	-0.0428	-0.0004	0.0005	0.7	2:35
R5	R6	0.0566	-0.0002	0.0003	0.5	2:36
R6	R8	0.0053	-0.0005	0.0005	0.9	2:37
R6	R4	0.0924	0.0001	0.0005	0.1	2:38
R4	R3	-0.0774	0.0000	0.0004	0.1	2:39
R3	R5	-0.0716	-0.0000	0.0004	0.0	2:40
R3	G84	0.1537	0.0002	0.0008	0.2	2:41
R10	G82	-0.1703	-0.0001	0.0008	0.2	2:42

R14	G83	0.1734	0.0002	0.0006	0.3	2:43

Differential Level Loop Check Closures

==========

From	To	Elev Diff	StdErr	Length	File:Line
R18	R20.1	0.2733	0.0004	33	2:18
R20.1	R17	-0.3735	0.0005	44	2:17
R17	R18	0.1010	0.0003	17	2:19
Error of Closure:		-0.0008		94	
Standard Error:		0.0007			
Standardized Error:		1.0860			
R16.1	R14	0.0892	0.0004	31	2:23
R14	G83	0.1732	0.0006	72	2:43
G83	R17	-0.3104	0.0005	37	2:16
R17	R18	0.1010	0.0003	17	2:19
R18	R16.1	-0.0523	0.0005	45	2:22
Error of Closure:		-0.0007		202	
Standard Error:		0.0011			
Standardized Error:		0.6482			
R13	R15	-0.0702	0.0005	43	2:25
R15	R17	-0.0627	0.0004	32	2:20
R17	R18	0.1010	0.0003	17	2:19
R18	R16.1	-0.0523	0.0005	45	2:22
R16.1	R14	0.0892	0.0004	31	2:23
R14	R13	-0.0034	0.0003	14	2:24
Error of Closure:		-0.0016		182	
Standard Error:		0.0010			
Standardized Error:		1.5610			
G82	G84	0.1484	0.0011	201	2:14
G84	G83	0.2051	0.0008	124	2:15
G83	G82	-0.3545	0.0010	183	2:13
Error of Closure:		0.0010		508	
Standard Error:		0.0017			
Standardized Error:		0.5840			
R15	R16.1	-0.0155	0.0003	14	2:21
R16.1	R18	0.0523	0.0005	45	2:22
R18	R17	-0.1010	0.0003	17	2:19
R17	R15	0.0627	0.0004	32	2:20
Error of Closure:		0.0015		108	
Standard Error:		0.0008			
Standardized Error:		1.8997			
R11	R12	0.0284	0.0003	18	2:27
R12	R14	-0.0591	0.0003	20	2:28
R14	R13	-0.0034	0.0003	14	2:24
R13	R11	0.0335	0.0003	20	2:26
Error of Closure:		0.0006		72	
Standard Error:		0.0006			
Standardized Error:		0.9307			
R10	G82	-0.1702	0.0008	117	2:42
G82	G83	0.3545	0.0010	183	2:13
G83	R14	-0.1732	0.0006	72	2:43

R14	R12	0.0591	0.0003	20	2:28
R12	R10	-0.0692	0.0005	49	2:31

Error of Closure: -0.0010 441
Standard Error: 0.0016
Standardized Error: 0.6267

R9	R10	-0.0006	0.0003	13	2:30
R10	R12	0.0692	0.0005	49	2:31
R12	R11	-0.0284	0.0003	18	2:27
R11	R9	-0.0402	0.0005	37	2:29

Error of Closure: -0.0000 117
Standard Error: 0.0008
Standardized Error: 0.0000

R8	R7	-0.0190	0.0004	25	2:33
R7	R9	0.2047	0.0004	35	2:34
R9	R10	-0.0006	0.0003	13	2:30
R10	R8	-0.1852	0.0005	37	2:32

Error of Closure: 0.0001 110
Standard Error: 0.0008
Standardized Error: 0.1255

R6	R8	0.0058	0.0005	47	2:37
R8	R10	0.1852	0.0005	37	2:32
R10	G82	-0.1702	0.0008	117	2:42
G82	G84	0.1484	0.0011	201	2:14
G84	R3	-0.1535	0.0008	114	2:41
R3	R4	0.0774	0.0004	23	2:39
R4	R6	-0.0923	0.0005	41	2:38

Error of Closure: -0.0008 580
Standard Error: 0.0018
Standardized Error: 0.4372

R7	R5	-0.0424	0.0005	42	2:35
R5	R3	0.0716	0.0004	35	2:40
R3	R4	0.0774	0.0004	23	2:39
R4	R6	-0.0923	0.0005	41	2:38
R6	R8	0.0058	0.0005	47	2:37
R8	R7	-0.0190	0.0004	25	2:33

Error of Closure: -0.0011 213
Standard Error: 0.0011
Standardized Error: 0.9920

R5	R6	0.0568	0.0003	21	2:36
R6	R4	0.0923	0.0005	41	2:38
R4	R3	-0.0774	0.0004	23	2:39
R3	R5	-0.0716	0.0004	35	2:40

Error of Closure: -0.0001 120
Standard Error: 0.0008
Standardized Error: 0.1201

Elapsed Time = 00:00:00

Java·Applied·Geodesy·3D - Report

Least-Squares Adjustment & Deformation Analysis

Project

JAGD Version:	v20240320
Name of Project:	
Project Id:	
Customer Id:	
Person in Charge:	nemnj
Date of Calculation:	2024-10-25
Date of Report:	2024-10-25
Kind of network:	free Network (l_2)
Adjustment Type:	Least squares adjustment (L_2Norm)
Coordinate frame:	Local Cartesian model
Probability Value α:	0.10 %
Test Power (1-β):	80.00 %
Description:	

B-Method (Baarda)

d1	d2	α in %	(1 - β) in %	λ (α,β)	log($p_{d1,d2}$)	q ($F_{d1,d2,1-\alpha}$)
1.00	∞	0.10	80.00	17.07	-6.91	10.83
1.00	11.00	0.86	80.00	17.07	-4.76	10.19
2.56	∞	0.42	80.00	17.07	-5.46	4.78
9.44	∞	3.70	80.00	17.07	-3.30	1.96
12.00	∞	5.32	80.00	17.07	-2.93	1.73

Test statistics Φ^{-1} w.r.t. the degree of freedom *d1* and *d2*, respectively

Variance Component Estimation

Group name	n_G	r_G	Ω_G	$1 : \sigma^2_G$	q ($F_{r,\infty,1-\alpha}$)	$T_G \leq q \mid H_0$
Total Adjustment	31	12.00	14.21	1.18	1.73	✔
Levelling	31	12.00	14.21	1.18	1.73	✔
Levelling σ_a	31	2.56	3.40	1.33	4.78	✔
Levelling σ_b	31	9.44	10.81	1.15	1.96	✔

Variance Component Estimation

Principal component analysis

k	√λ(k) in mm	λ(k)/trace(Cxx) in %
20	0.5	35.42

Principal component analysis

Datum Points: 168÷690 Datum

Point-Id	Code	Height z0 in m	Height z in m	σ_z in mm	a in mm	Δ_z in mm	c_z in mm
G82	**0**	110.5550	110.5555	0.3	0.8	0.5	-0.0
G83	**0**	110.9110	110.9095	0.2	0.6	-1.5	0.1
G84	**0**	110.7050	110.7041	0.3	0.8	-0.9	-0.0
R17	**0**	110.5991	110.5991	0.2	0.6	-0.0	0.1
R20.1	**0**	110.9721	110.9728	0.2	0.7	0.7	0.2
R18	**0**	110.6991	110.6996	0.2	0.6	0.5	0.2
R15	**0**	110.6625	110.6625	0.2	0.5	0.0	0.1
R16.1	**0**	110.6463	110.6471	0.2	0.5	0.8	0.1
R14	**0**	110.7361	110.7362	0.1	0.4	0.1	0.1
R13	**0**	110.7327	110.7328	0.2	0.5	0.1	0.1
R11	**0**	110.7668	110.7665	0.2	0.5	-0.3	0.0
R12	**0**	110.7955	110.7951	0.2	0.5	-0.4	0.0
R9	**0**	110.7265	110.7264	0.2	0.5	-0.1	-0.0
R10	**0**	110.7259	110.7258	0.2	0.5	-0.1	-0.0
R8	**0**	110.5407	110.5407	0.2	0.5	-0.0	-0.1
R7	**0**	110.5211	110.5216	0.2	0.5	0.5	-0.1
R5	**0**	110.4787	110.4790	0.2	0.6	0.3	-0.2
R6	**0**	110.5355	110.5356	0.2	0.6	0.1	-0.2
R4	**0**	110.6284	110.6280	0.2	0.7	-0.4	-0.2
R3	**0**	110.5503	110.5506	0.2	0.7	0.3	-0.2
						-1.5	

Point Group: 168÷690 Datum

Levelling: 168÷690 Points

Station-Id	Target-Id	ih in m	th in m	δh/δ in m	σδ in mm	δh in m	σ in mm	r in %	ε in mm	τ̄ in mm	EP in mm	EP·SP in mm	τ(1) in mm	τ(λ) in mm	Ω	log(p_{prio})	log(p_{post})	T_{prio}	T_{post}	T ≤ q | H_0
G83	**G82**	0.0000	0.0000	-0.3545	0.4	-0.3540	0.3	59.03	0.5	-0.8	-0.3	0.3	-0.6	-2.4	1.19	-1.86	-1.59	2.01	1.82	✔
G82	**G84**	0.0000	0.0000	0.1484	0.5	0.1487	0.3	56.67	0.3	-0.5	-0.2	0.2	-0.6	-2.5	0.38	-0.88	-0.74	0.66	0.54	✔
G84	**G83**	0.0000	0.0000	0.2051	0.4	0.2053	0.3	44.64	0.2	-0.5	-0.3	0.3	-0.5	-2.3	0.43	-1.12	-0.94	0.96	0.80	✔
G83	**R17**	0.0000	0.0000	-0.3104	0.2	-0.3104	0.2	29.73	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.4	-1.6	0.01	-0.19	-0.16	0.05	0.04	✔
R17	**R20.1**	0.0000	0.0000	0.3735	0.2	0.3737	0.2	45.65	0.2	-0.4	-0.2	0.3	-0.3	-1.4	0.51	-1.24	-1.04	1.12	0.95	✔
R20.1	**R18**	0.0000	0.0000	-0.2733	0.2	-0.2732	0.2	36.35	0.1	-0.4	-0.2	0.4	-0.3	-1.4	0.41	-1.24	-1.04	1.12	0.95	✔
R18	**R17**	0.0000	0.0000	-0.1007	0.2	-0.1005	0.1	35.36	0.2	-0.6	-0.4	0.7	-0.3	-1.1	1.49	-3.22	-2.92	4.23	4.66	✔
R17	**R15**	0.0000	0.0000	0.0632	0.2	0.0634	0.2	40.27	0.2	-0.5	-0.3	0.5	-0.3	-1.3	1.01	-2.18	-1.88	2.51	2.36	✔
R15	**R16.1**	0.0000	0.0000	-0.0155	0.2	-0.0154	0.1	29.92	0.1	-0.2	-0.1	0.3	-0.3	-1.2	0.12	-0.64	-0.53	0.40	0.31	✔
R16.1	**R18**	0.0000	0.0000	0.0523	0.2	0.0525	0.2	45.24	0.2	-0.5	-0.3	0.4	-0.3	-1.4	1.04	-2.05	-1.76	2.31	2.13	✔
R16.1	**R14**	0.0000	0.0000	0.0892	0.2	0.0891	0.2	39.51	-0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	1.3	0.19	-0.71	-0.60	0.47	0.38	✔
R14	**R13**	0.0000	0.0000	-0.0034	0.2	-0.0033	0.1	34.98	0.1	-0.2	-0.1	0.3	-0.3	-1.1	0.25	-0.91	-0.77	0.70	0.57	✔
R13	**R15**	0.0000	0.0000	-0.0702	0.2	-0.0703	0.2	46.19	-0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	1.4	0.38	-1.02	-0.85	0.83	0.68	✔
R13	**R11**	0.0000	0.0000	0.0335	0.2	0.0337	0.2	31.75	0.2	-0.6	-0.4	0.7	-0.3	-1.3	1.04	-2.66	-2.34	3.28	3.30	✔
R11	**R12**	0.0000	0.0000	0.0284	0.2	0.0285	0.1	36.60	0.1	-0.4	-0.3	0.5	-0.3	-1.1	0.79	-1.95	-1.67	2.16	1.97	✔
R12	**R14**	0.0000	0.0000	-0.0591	0.2	-0.0589	0.2	33.01	0.2	-0.6	-0.4	0.7	-0.3	-1.2	1.30	-3.06	-2.74	3.95	4.23	✔
R11	**R9**	0.0000	0.0000	-0.0402	0.2	-0.0402	0.2	36.86	0.0	-0.1	-0.0	0.1	-0.4	-1.5	0.02	-0.18	-0.15	0.04	0.03	✔
R9	**R10**	0.0000	0.0000	-0.0006	0.2	-0.0006	0.1	28.36	0.0	-0.2	-0.1	0.2	-0.3	-1.2	0.09	-0.56	-0.47	0.32	0.25	✔
R10	**R12**	0.0000	0.0000	0.0692	0.2	0.0693	0.2	46.47	0.1	-0.2	-0.1	0.1	-0.4	-1.5	0.10	-0.43	-0.37	0.21	0.16	✔
R10	**R8**	0.0000	0.0000	-0.1852	0.2	-0.1851	0.2	37.42	0.1	-0.2	-0.1	0.2	-0.4	-1.5	0.16	-0.67	-0.56	0.43	0.34	✔
R8	**R7**	0.0000	0.0000	-0.0190	0.2	-0.0191	0.2	36.57	-0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	1.3	0.26	-0.92	-0.77	0.71	0.58	✔
R7	**R9**	0.0000	0.0000	0.2047	0.2	0.2048	0.2	35.62	0.1	-0.2	-0.1	0.2	-0.4	-1.5	0.09	-0.48	-0.40	0.25	0.19	✔
R7	**R5**	0.0000	0.0000	-0.0424	0.2	-0.0426	0.2	36.79	-0.2	0.6	0.4	0.5	0.4	1.6	0.88	-2.11	-1.81	2.40	2.24	✔
R5	**R6**	0.0000	0.0000	0.0568	0.2	0.0567	0.2	32.00	-0.1	0.4	0.3	0.5	0.3	1.3	0.54	-1.65	-1.40	1.70	1.49	✔
R6	**R8**	0.0000	0.0000	0.0053	0.2	0.0050	0.2	39.13	-0.3	0.7	0.4	0.6	0.4	1.6	1.19	-2.51	-2.20	3.05	3.00	✔
R6	**R4**	0.0000	0.0000	0.0923	0.2	0.0923	0.2	35.15	0.0	-0.1	-0.0	0.1	-0.4	-1.6	0.01	-0.12	-0.11	0.02	0.02	✔
R4	**R3**	0.0000	0.0000	-0.0774	0.2	-0.0774	0.2	22.74	0.0	-0.1	-0.0	0.1	-0.4	-1.6	0.00	-0.12	-0.11	0.02	0.02	✔
R3	**R5**	0.0000	0.0000	-0.0716	0.2	-0.0716	0.2	34.44	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	✔
R3	**G84**	0.0000	0.0000	0.1535	0.4	0.1536	0.3	36.67	0.1	-0.2	-0.1	0.1	-0.6	-2.4	0.03	-0.23	-0.20	0.07	0.05	✔
R10	**G82**	0.0000	0.0000	-0.1702	0.4	-0.1703	0.3	42.91	-0.1	0.3	0.2	0.2	0.5	2.2	0.17	-0.63	-0.53	0.39	0.31	✔
R14	**G83**	0.0000	0.0000	0.1732	0.3	0.1733	0.2	53.99	0.1	-0.2	-0.1	0.1	-0.4	-1.6	0.13	-0.47	-0.39	0.24	0.19	✔
								12.00	0.5	-0.8					14.21					✔

Observation Group: 168÷690 Points (A-priori: σ_a = 0.1 mm, σ_b = 1.0 mm)

Reliability of terrestrial observations

Observation Group	Observation Type	Station-Id	Target-Id	r_{min} in %	r_{avg} in %
168÷690 Points	**Levelling**	R4	R3	22.74	38.71

Summary of redundancy r

Observation Group	Observation Type	Station-Id	Target-Id	log($p_{prio,min}$)	log($p_{prio,avg}$)
168÷690 Points	**Levelling**	R18	R17	-3.22	-1.16

Summary of (a-priori) probability value p

Observation Group	Observation Type	Station-Id	Target-Id	EP_{max} in mm	EP_{avg} in mm
168÷690 Points	**Levelling**	R6	R8	0.4	0.2

Summary of influence on point position due to an undetected gross-error EP

Levelling



Distribution of redundancy r (Mean interval: {r | 30.00 % ≤ r ≤ 70.00 %})



Distribution of (a-priori) probability value p-value (Mean interval: {p-value | 1.00 % ≤ p-value ≤ 5.00 %})



Distribution of influence on point position due to an undetected gross-error EP (Mean interval: {EP | 1.0 mm ≤ EP ≤ 5.0 mm})

- Подударност основне геодетске мреже и радних репера

Број тачке	H0 (нулта)	H1 (прва)	H2 (друга)	H3 (трећа)	Вектор померања (мм)			
					H2-H1	H2-H0	H3-H2	H3-H0
GMO082	110.5550	110.5540	110.5551	110.5555	1.1	0.1	0.4	0.5
GMO083	110.9110	110.9090	110.9096	110.9095	0.6	-1.4	-0.1	-1.5
GMO084	110.7050	110.7040	110.7043	110.7041	0.3	-0.7	-0.2	-0.9
R17	110.6076	110.6012	110.5996	110.5991	-1.6	-8.0	-0.5	-8.5
R20.1	/	/	**110.9730**	**110.9728**	/	/	-0.2	/
R18	110.7051	110.7016	110.6999	110.6996	-1.7	-5.2	-0.3	-5.5
R15	110.6684	110.6643	110.6632	110.6625	-1.1	-5.2	-0.7	-5.9
R16.1	/	/	**110.6478**	110.6471	/	/	-0.7	/
R14	110.7403	110.7386	110.7374	110.7362	-1.2	-2.9	-1.2	-4.1
R13	110.7361	110.7345	110.7339	110.7328	-0.6	-2.2	-1.1	-3.3
R11	110.7716	110.7698	110.7674	110.7665	-2.4	-4.2	-0.9	-5.1
R12	110.8003	110.7984	110.7963	110.7951	-2.1	-4.0	-1.2	-5.2
R9	110.7317	110.7297	110.7278	110.7264	-1.9	-3.9	-1.4	-5.3
R10	110.7302	110.7282	110.7266	110.7258	-1.6	-3.6	-0.8	-4.4
R8	110.5447	110.5443	110.5418	110.5407	-2.5	-2.9	-1.1	-4.0
R7	110.5255	110.5246	110.5217	110.5216	-2.9	-3.8	-0.1	-3.9
R5	110.4818	110.4806	110.4791	110.4790	-1.5	-2.7	-0.1	-2.8
R6	110.5397	110.5389	110.5367	110.5356	-2.2	-3.0	-1.1	-4.1
R4	110.6314	110.6303	110.6291	110.6280	-1.2	-2.3	-1.1	-3.4
R3	110.5534	110.5522	110.5512	110.5506	-1.0	-2.2	-0.6	-2.8

6. Графичка документација

Прилог 2 - Нивелманска мерења

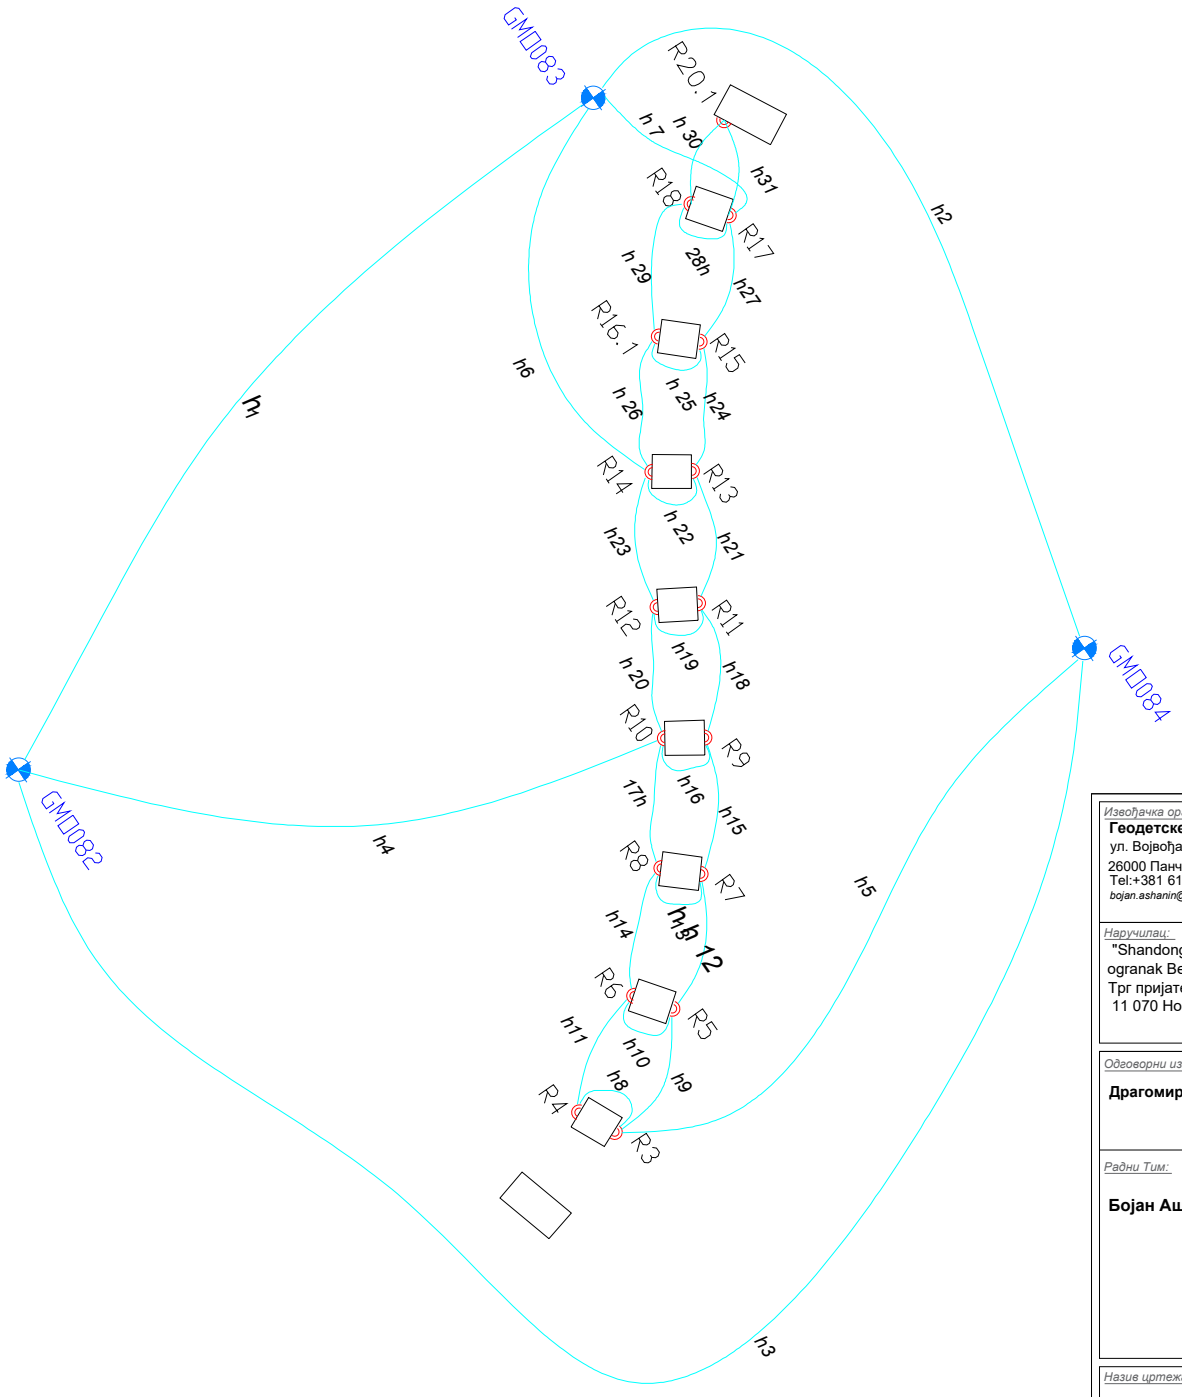

ЛЕГЕНДА:

GM0083	ПОСТОЈЕЋИ СТУБОВИ ГЕОДЕТСКЕ МРЕЖЕ
R1	РЕПЕРИ НА ОБЈЕКТУ
	МЕРЕЊА ПРЕЦИЗНИМ НИВЕЛМАНОМ

БОЈАН АШАНИН ПР
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ
АШАНИН
ПАНЧЕВО

Извођачка организација:
Геодетске услуге Ашанин
ул. Војвођански булевар 32/38
26000 Панчево
Tel:+381 61 29 66 216
bojan.ashanin@gmail.com

Инвеститор:
"Инфраструктура Железнице Србије" а.д.
Немањина 6/4,
11 000 Београд

Наручилац:
"Shandong Luqiao group CO. LTD
ogranak Beograd"
Трг пријатељства Србије и Кине 4,
11 070 Нови Београд

Објекат:
Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Одговорни извођач:
Драгомир Стојићевић, дипл.инж.геодез.
Број лиценце:
471 J292 15

Потпис:

Техничка документације:
ПЗИ - ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

Радни Тим:
Бојан Ашанин, мастер инж. геодезије

Ознака и назив дела документа:
ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА

Ознака і Назив свеске:
PS1.1-1022 Пројекат 1Д мреже вијадукт на км 168+690

Назив цртежа:	Датум:	Размера:	Број пројекта:	*Цртеж бр:*
План нивелманских мерења у 1D мрежи	Октобар 2024.		PS1.1-1022	1
